Планирование структуры работ

Планирование работ происходит с помощью раздела «Структура работ» (Рисунок 80), пользователь может создавать структуру и привязывать новые и уже имеющиеся конструктивы к элементам структуры работ. В левой табличной части отображается структура работ, а в правой конструктивы, входящие в выбранную структуру, с объемом плановых и фактических показателей.

Такси

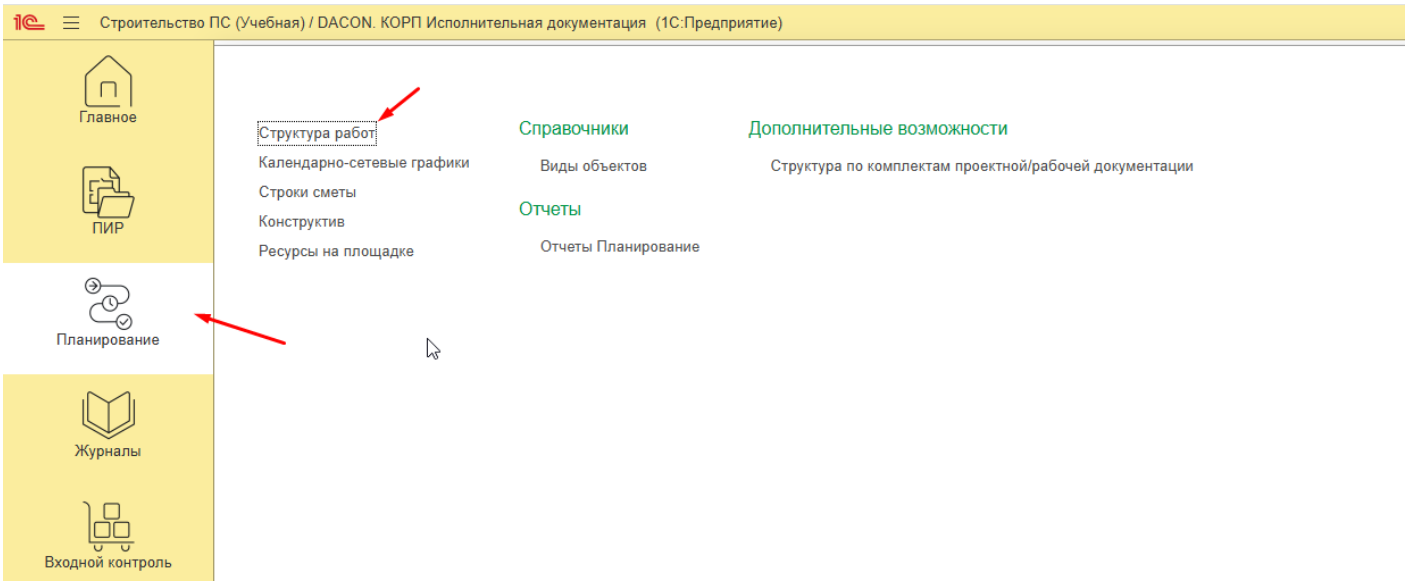

Версия 8.5

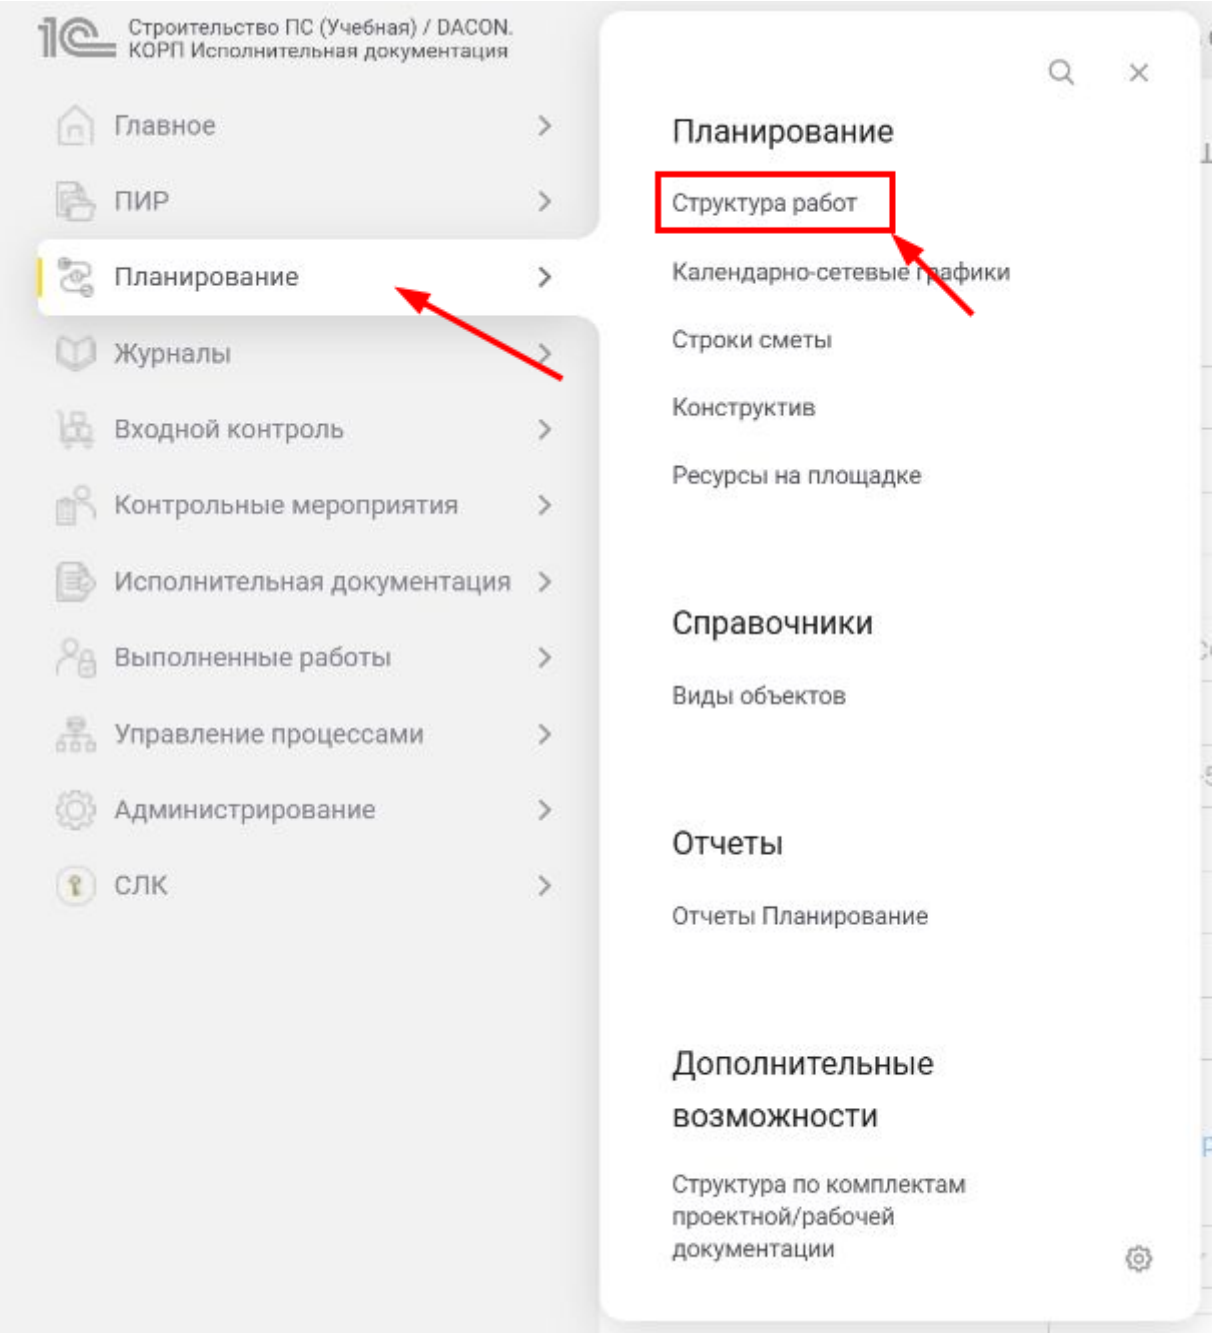

Рисунок 80 – Раздел «Структура работ»

Создание структуры работ. В меню «Планирование» необходимо открыть раздел «Структура работ» и нажать кнопку «Создать» над левой табличной частью (Рисунок 81).

Такси

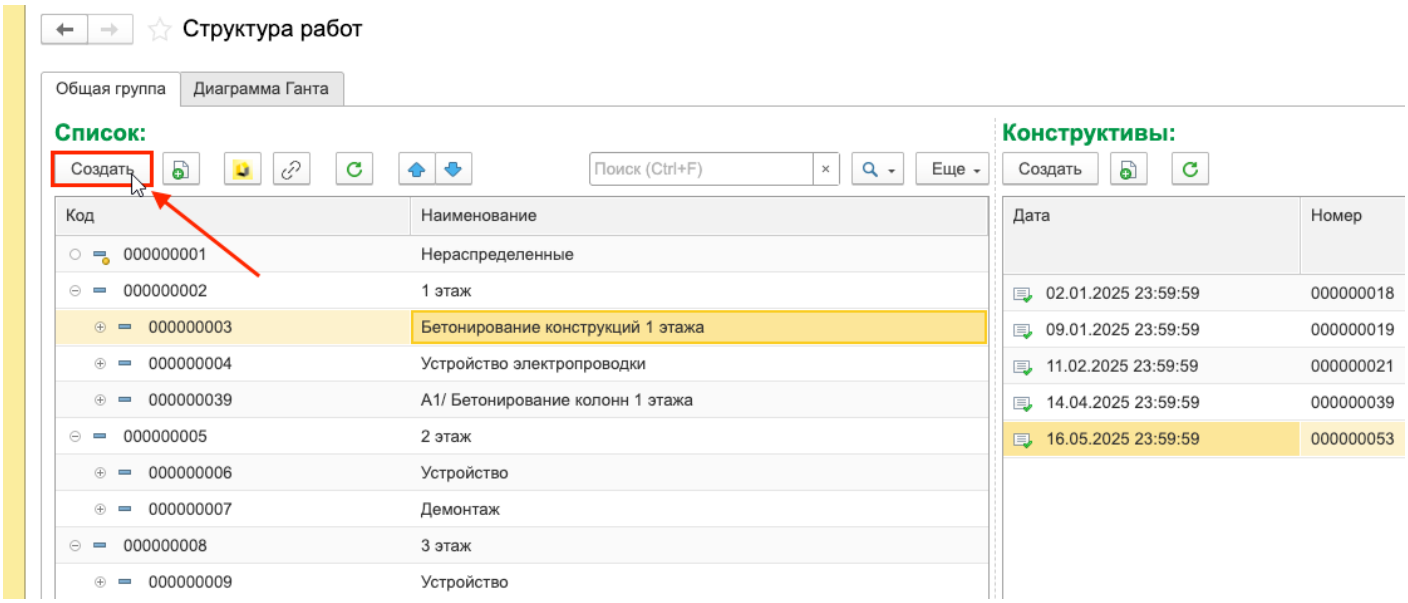

Версия 8.5

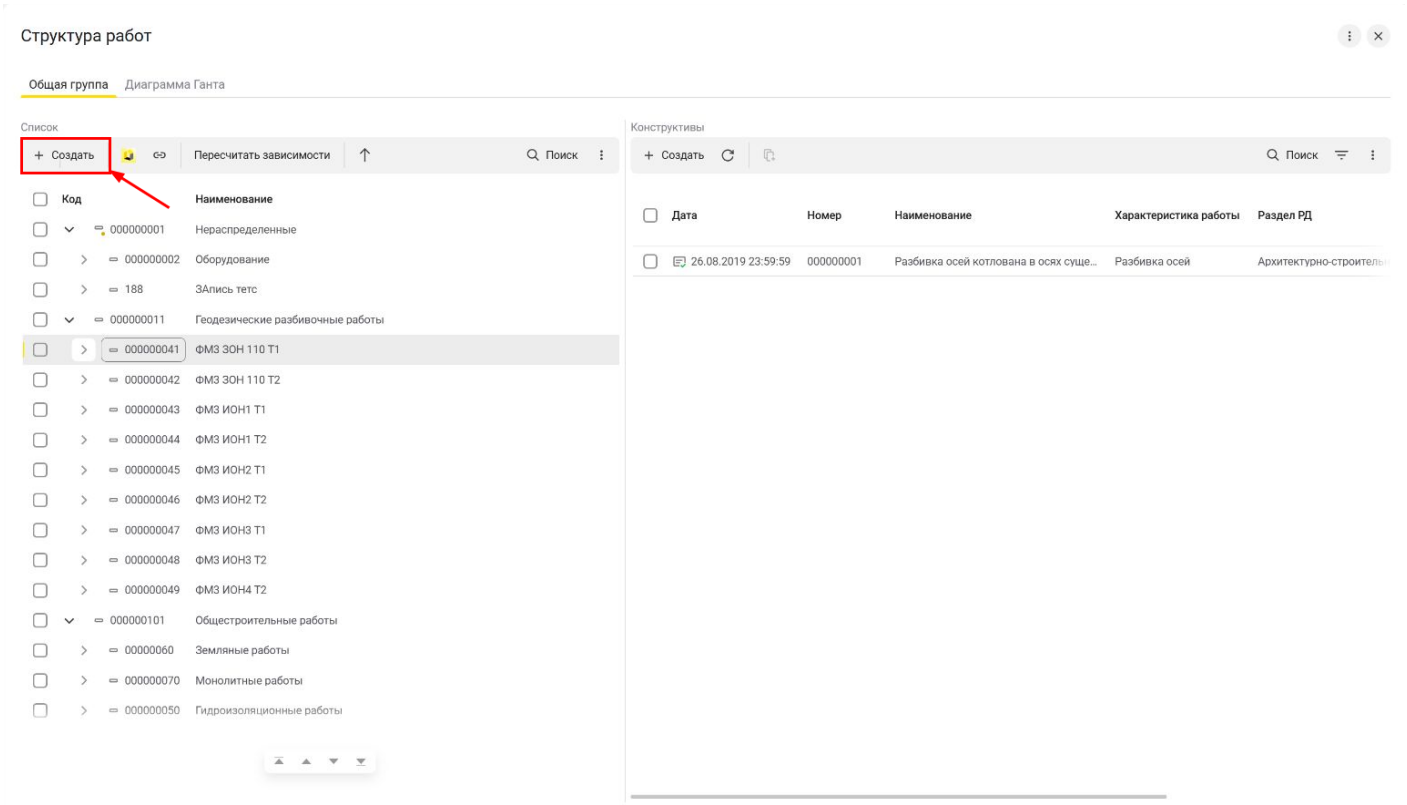

Рисунок 81 – Структура работ

В открывшемся окне (Рисунок 82):

- нужно выбрать раздел проектной или рабочей документации, по которому будут выполняться работы;
- указать наименование структуры;
- выбрать родителя (вышестоящую структуру), если требуется;

- указать плановые данные;

- также здесь можно создать конструктивы и указать материалы, которые будут необходимы при выполнении работ, указать привязку к строкам сметы.

После этого нажать «Записать и закрыть».

Такси

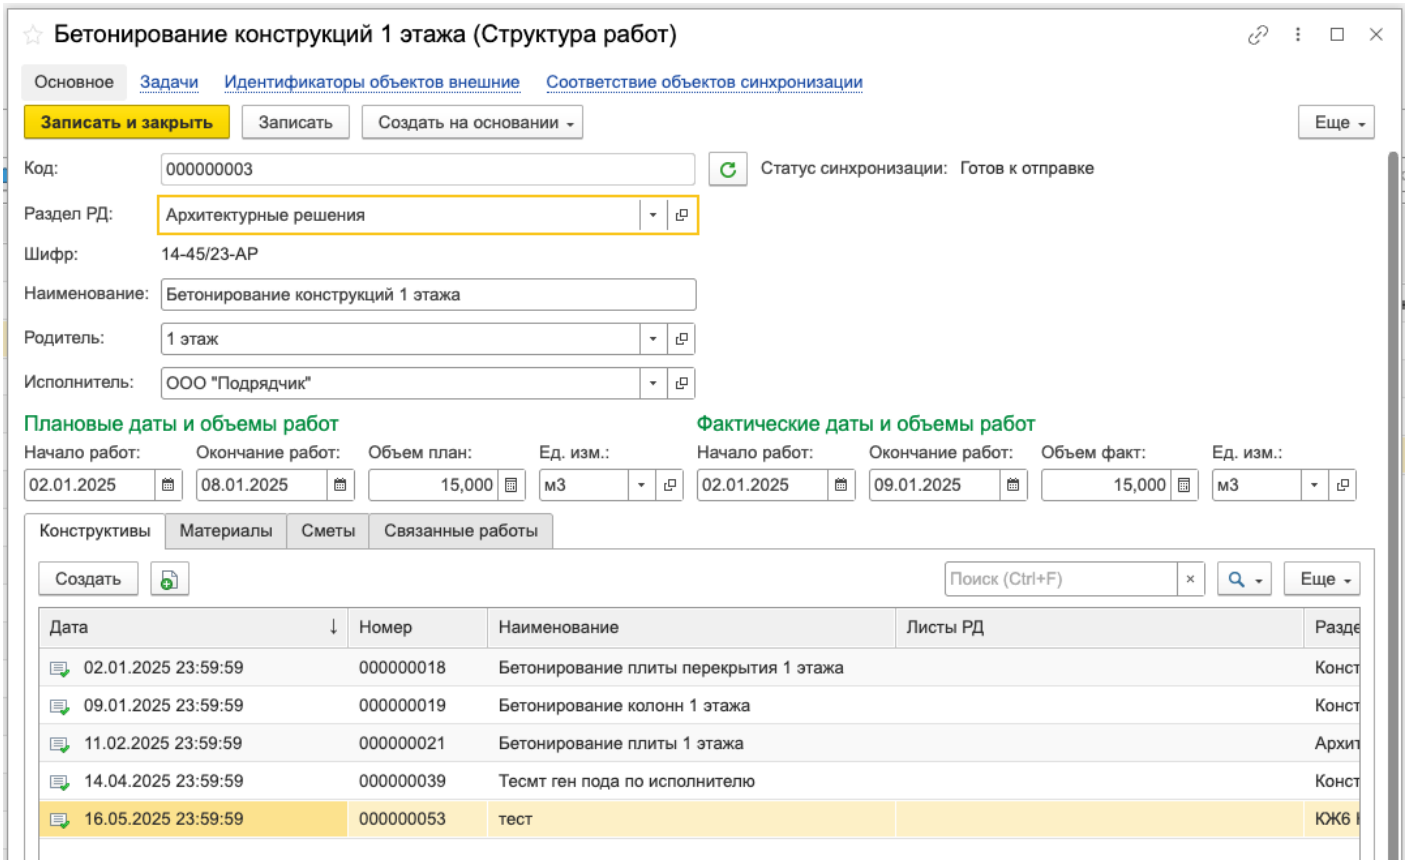

Версия 8.5

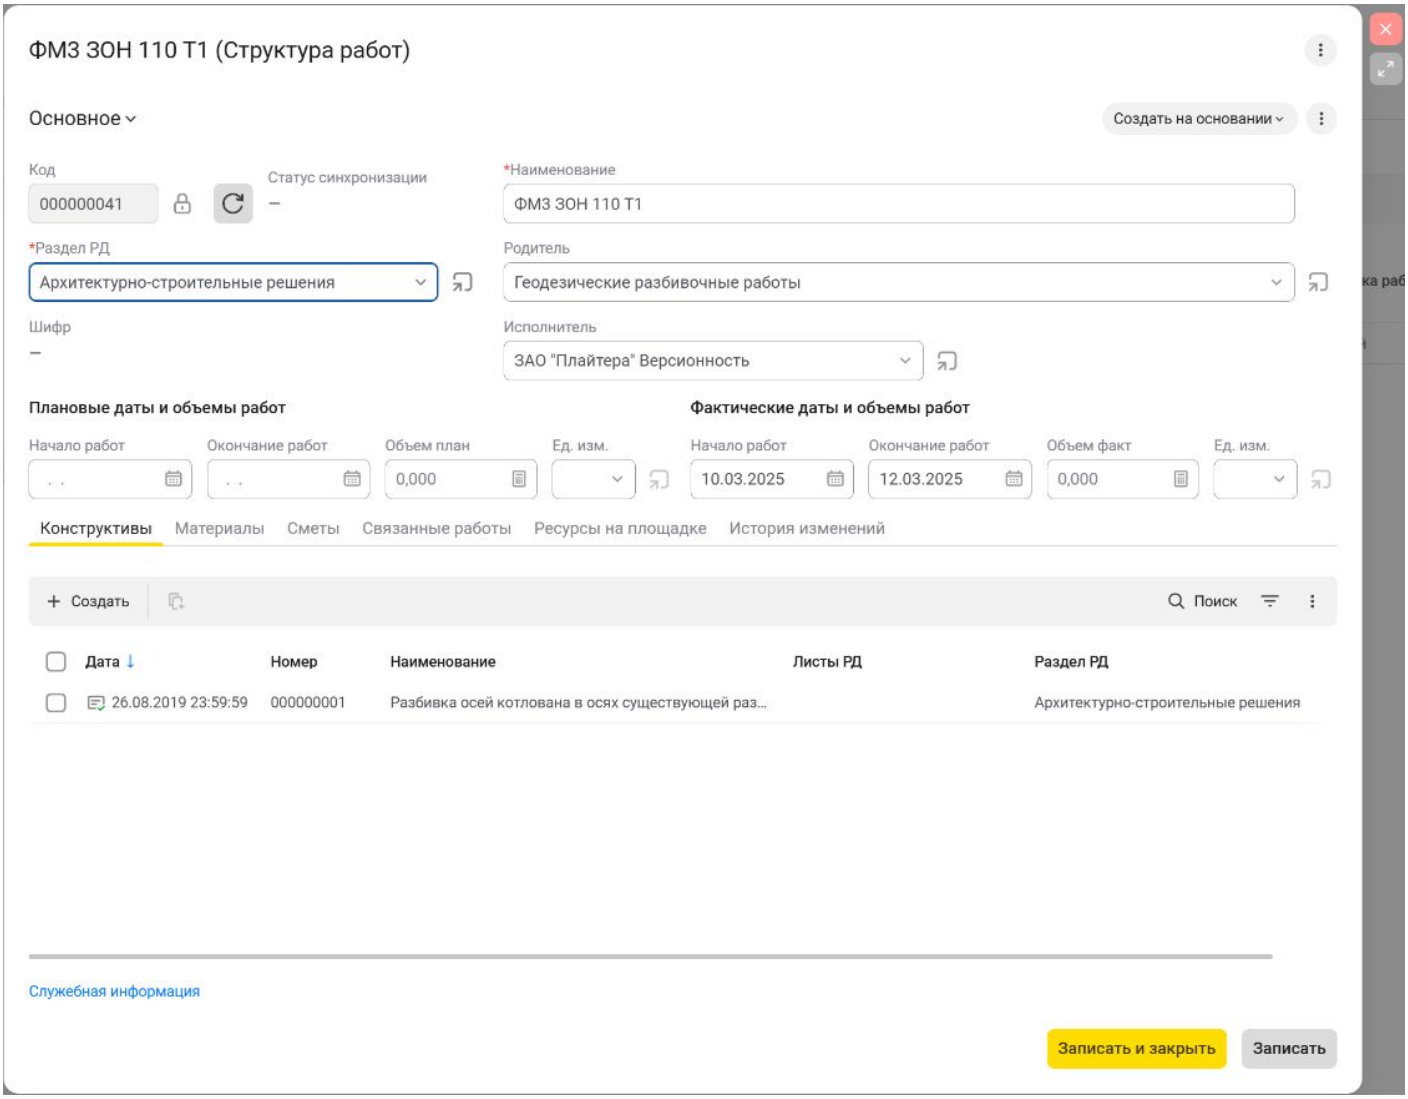

Рисунок 82 – Создание структуры работ

Также доступен просмотр структуры в разрезе разделов проектной документации (Рисунок 83), чтобы ее посмотреть, в меню «Планирование» нужно открыть группу «Дополнительные возможности» и выбрать «Структура по комплектам проектной/рабочей документации».

Такси

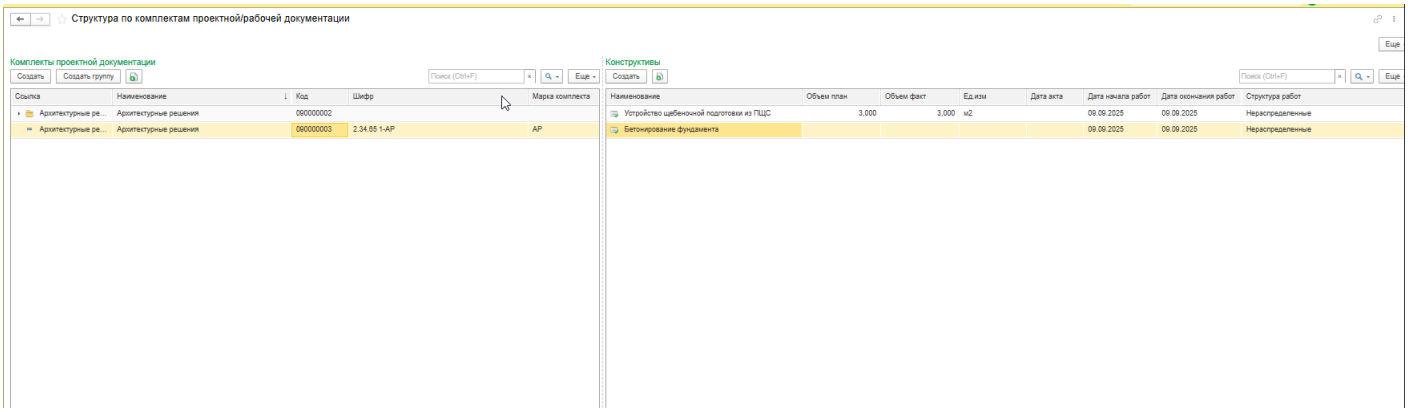

Версия 8.5

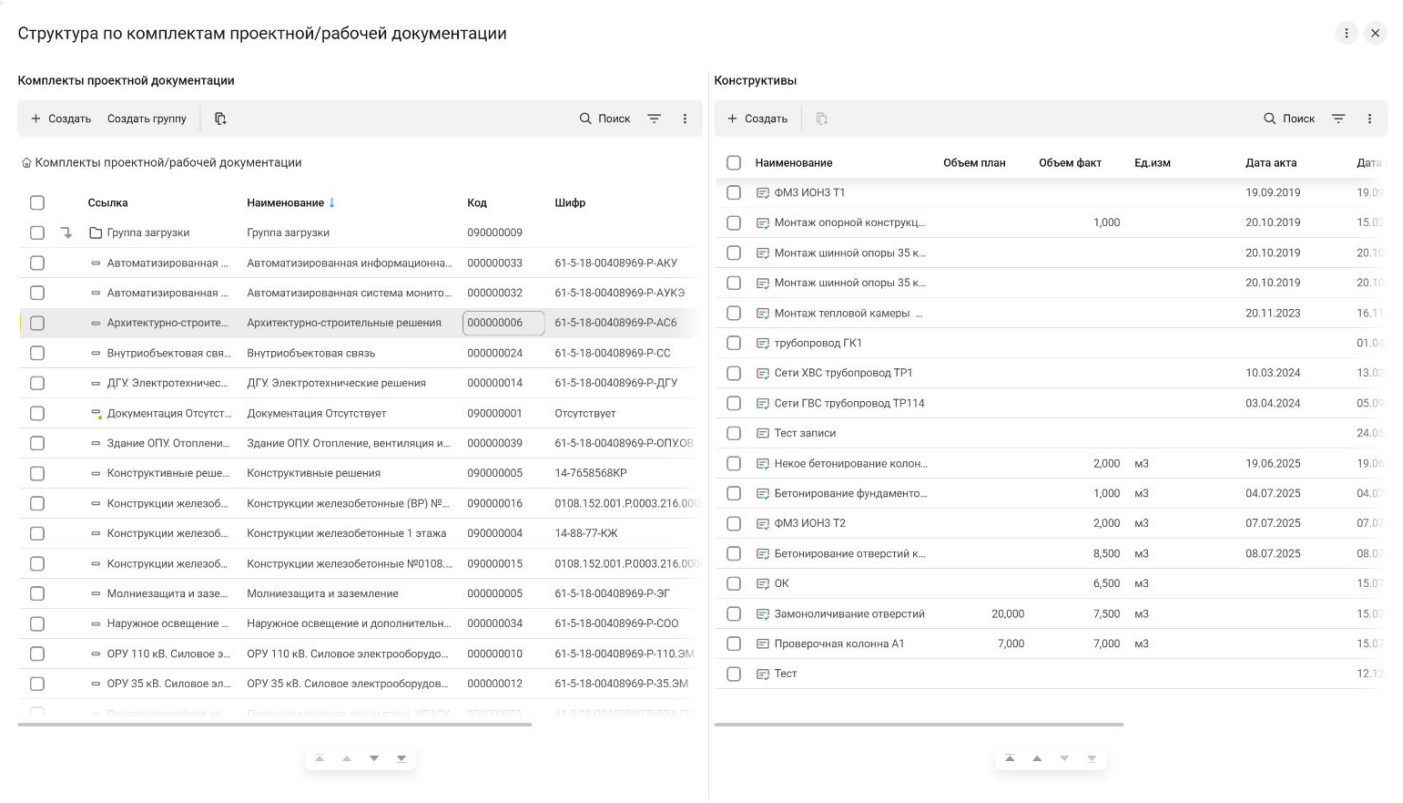

Рисунок 83 – Структура по комплектам проектной/рабочей документации

Построение диаграммы Ганта. В разделе «Структура работ» можно построить диаграмму Ганта на основании плановых и фактических дат выполнения работ, указанных в элементах структуры.

Для построения диаграммы нужно перейти на вкладку «Диаграмма Ганта» и нажать на кнопку «Сформировать». Если необходимо построить диаграмму на определенный промежуток времени, необходимо указать необходимые даты проведения работ (Рисунок 84).

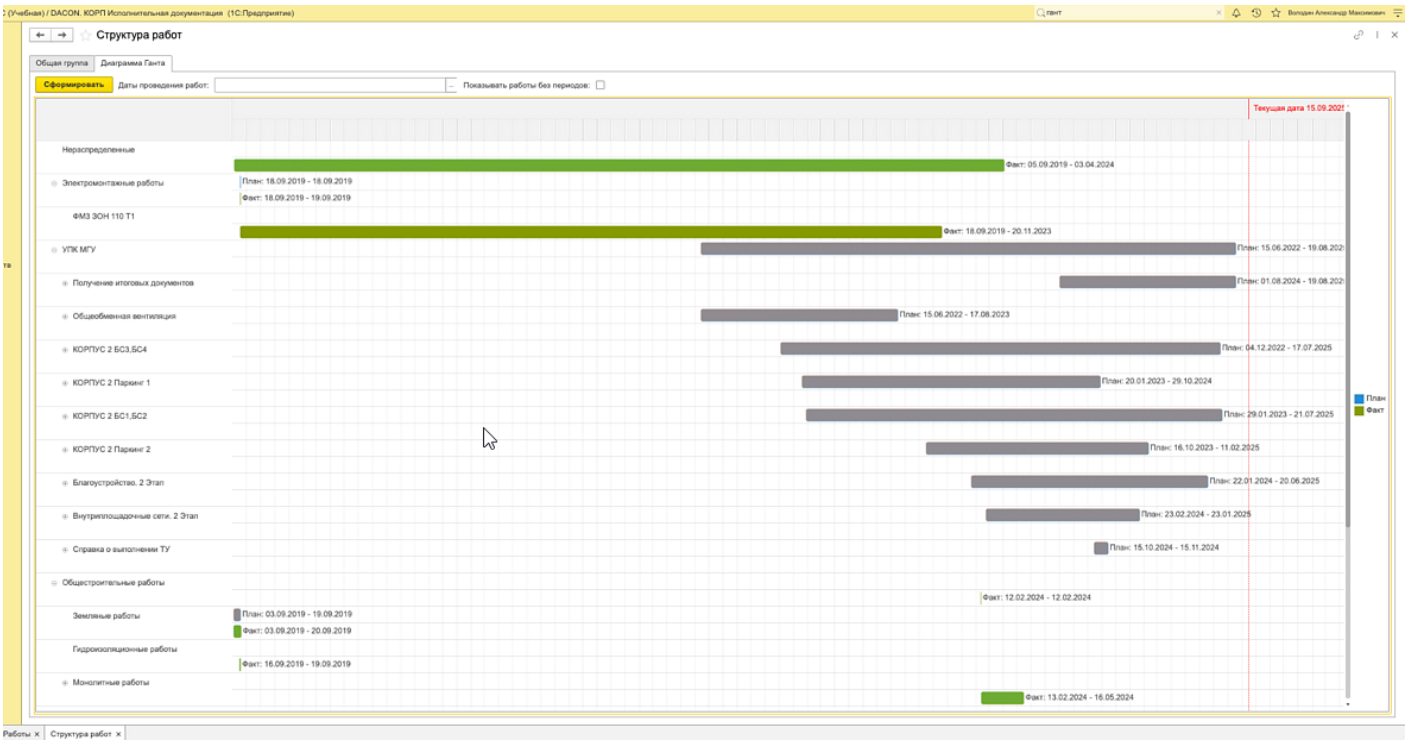

Версия 8.5

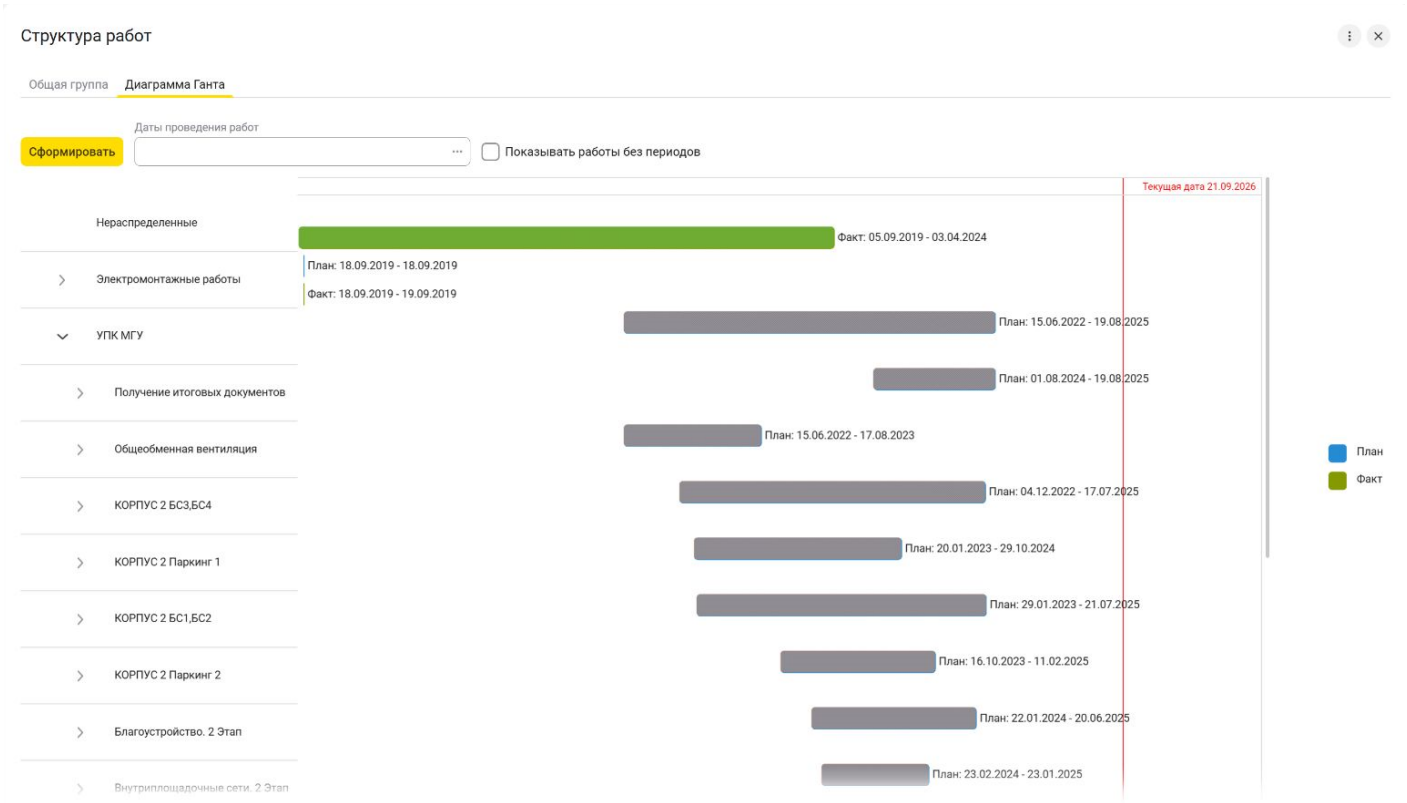

Рисунок 84 – Диаграмма Ганта

Изменение сроков выполнения работ с помощью документа КСГ. Если требуется изменить плановые даты выполнения работ, в меню «Планирование» (Рисунок 85) необходимо открыть список «Календарно-сетевые графики» и нажать кнопку «Создать».

Такси

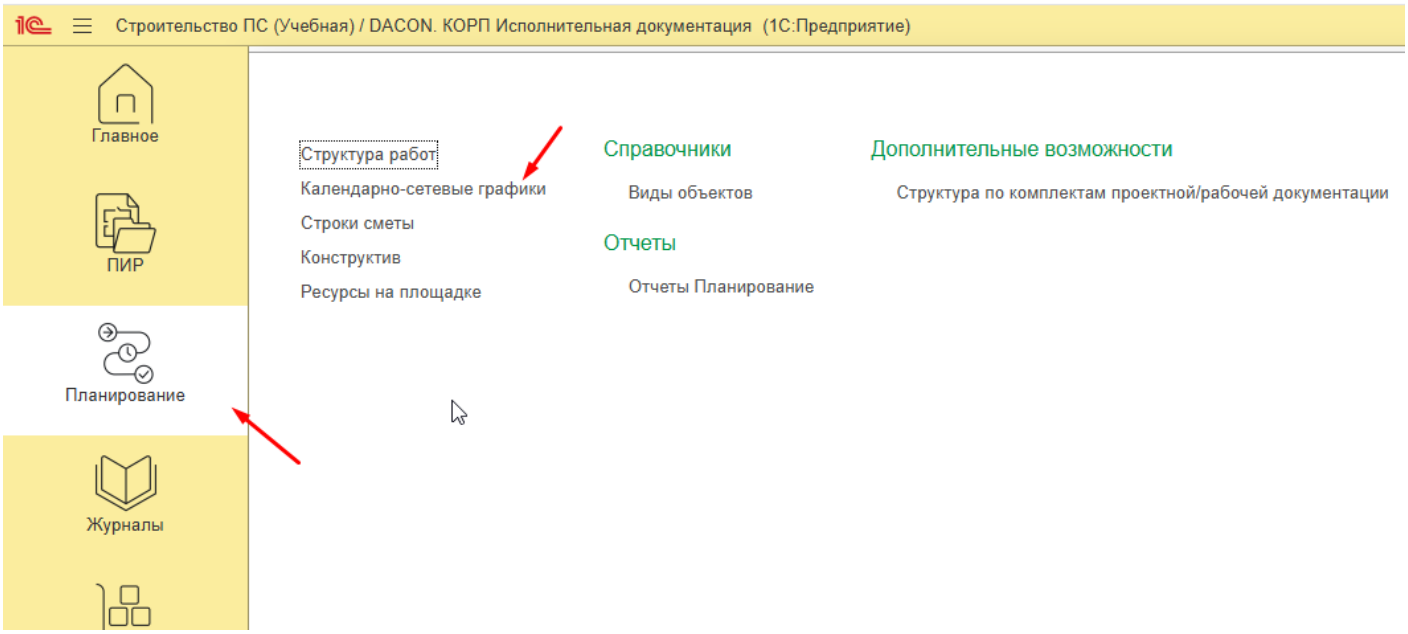

Версия 8.5

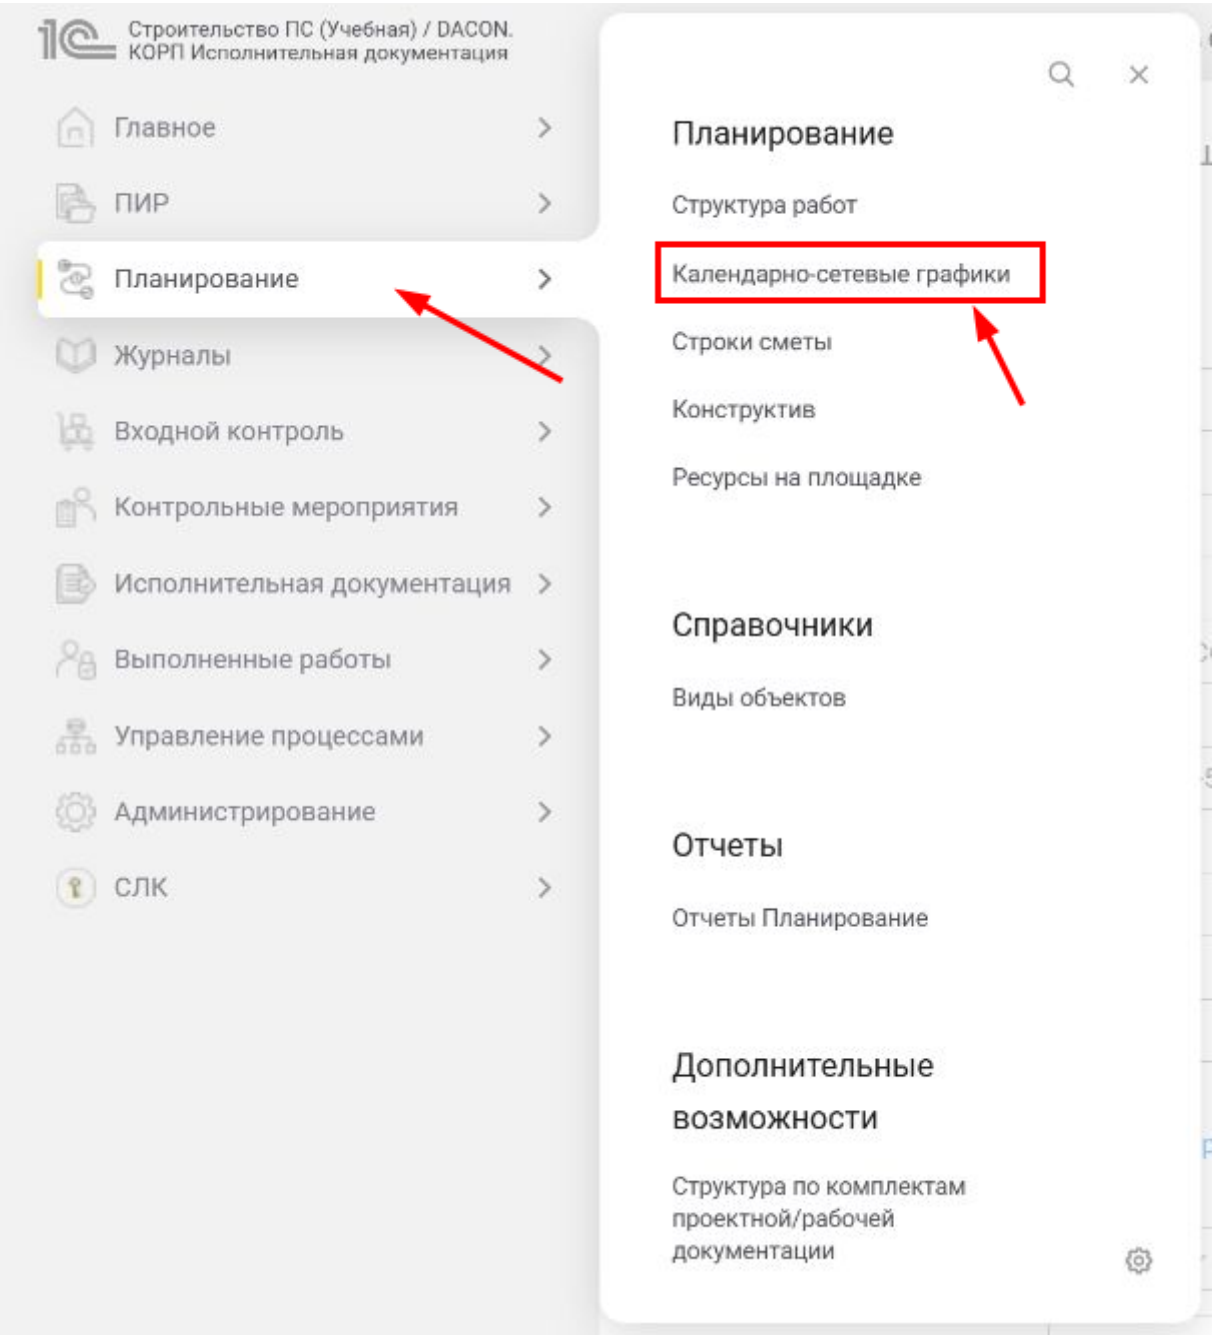

Рисунок 85 – Создание документа КСГ

Далее в открывшемся окне указываются (Рисунок 86):

- отправитель — пользователь, физическое лицо и должность пользователя, от имени которого направляется документ;
- получатель — пользователь, физическое лицо и должность пользователя, которому документ будет направлен на согласование.

Такси

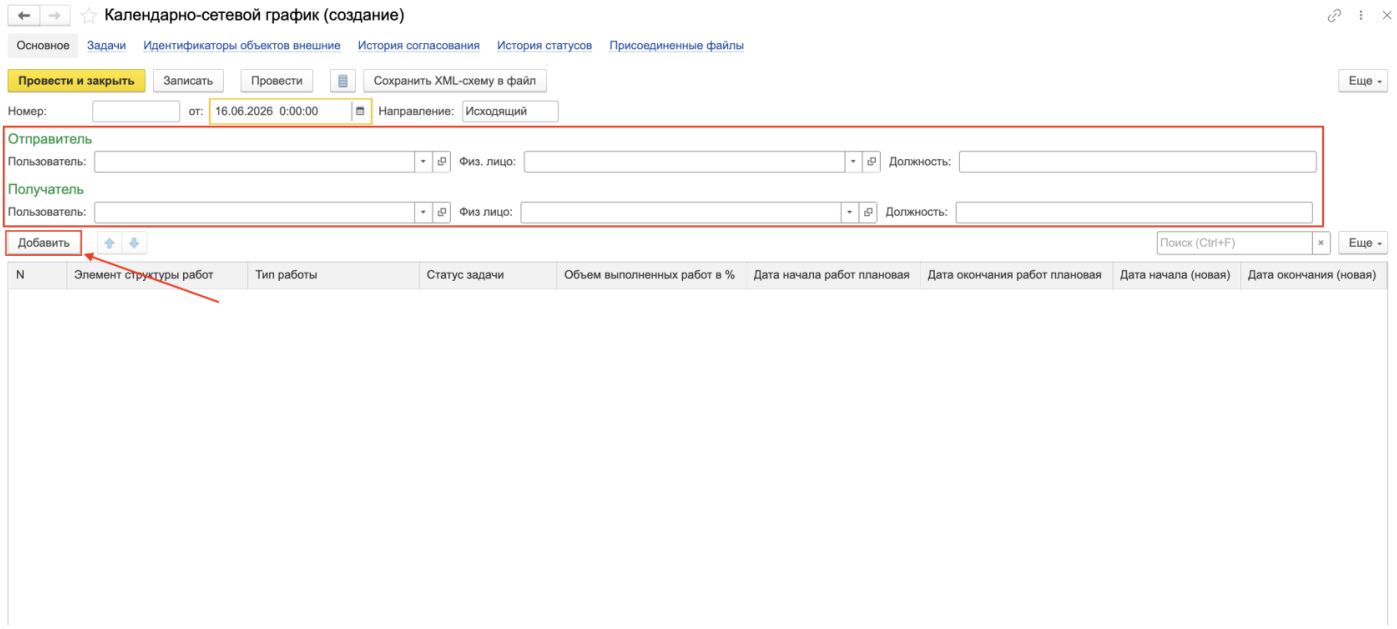

Версия 8.5

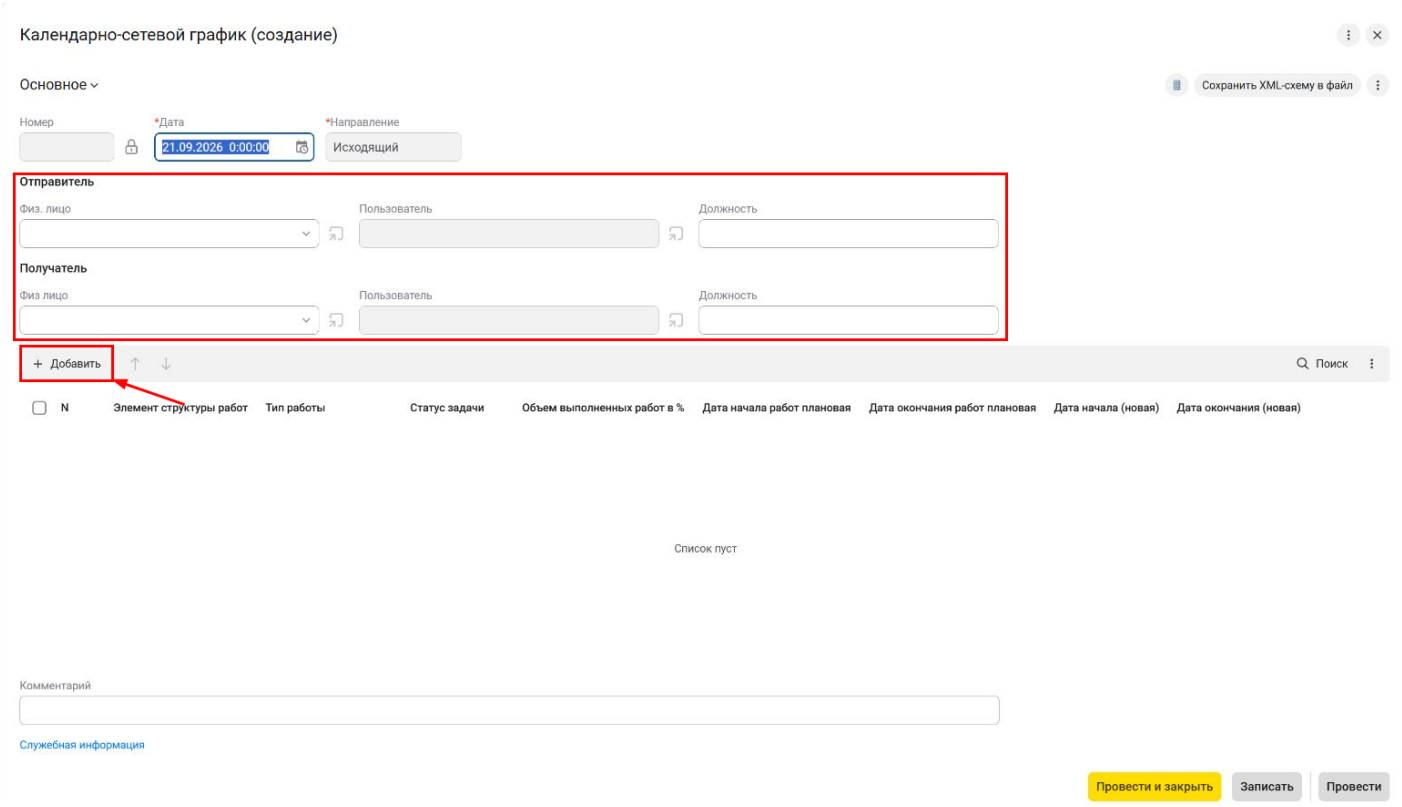

Рисунок 86 – Заполнение реквизитов документа КСГ

В табличной части документа указывается структура работ, по которой необходимо изменить даты выполнения. Для добавления строки следует нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужный элемент структуры работ. После выбора элемента текущие плановые даты выполнения подтягиваются автоматически. Поля новых дат остаются пустыми, в них необходимо указать новые даты начала и окончания выполнения, которые должны быть применены к структуре работ (Рисунок 87).

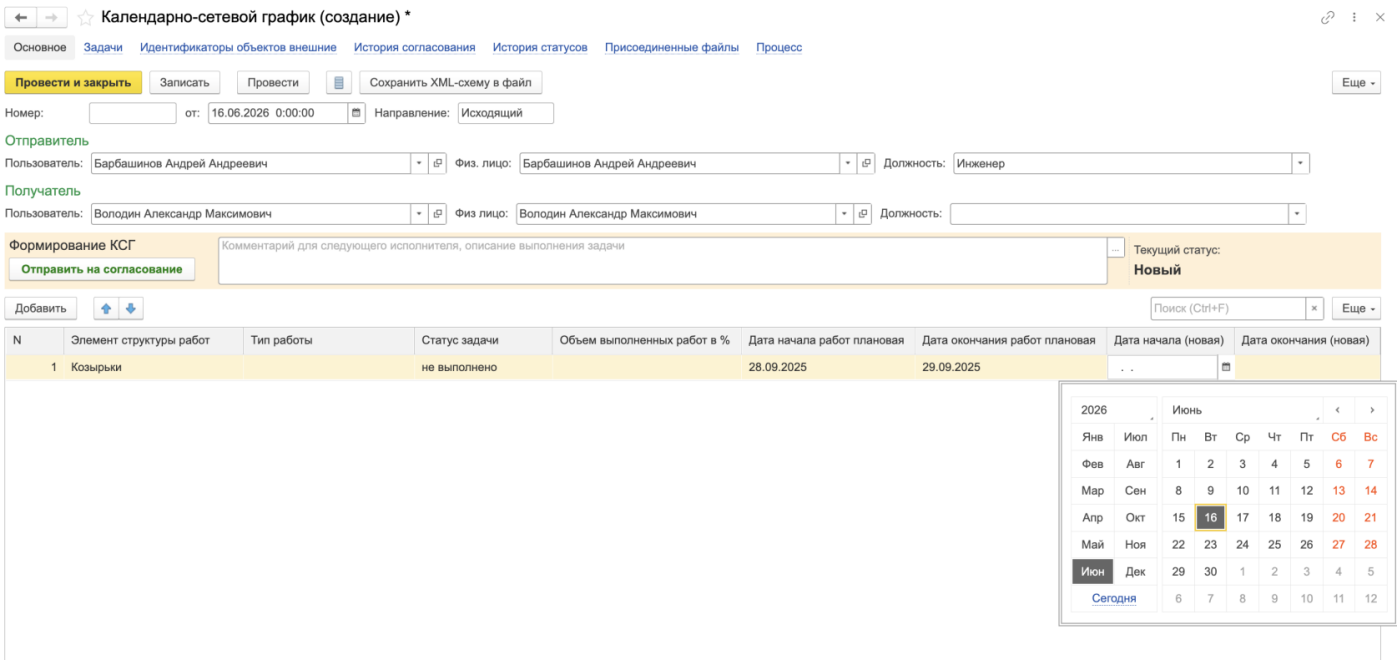

Версия 8.5

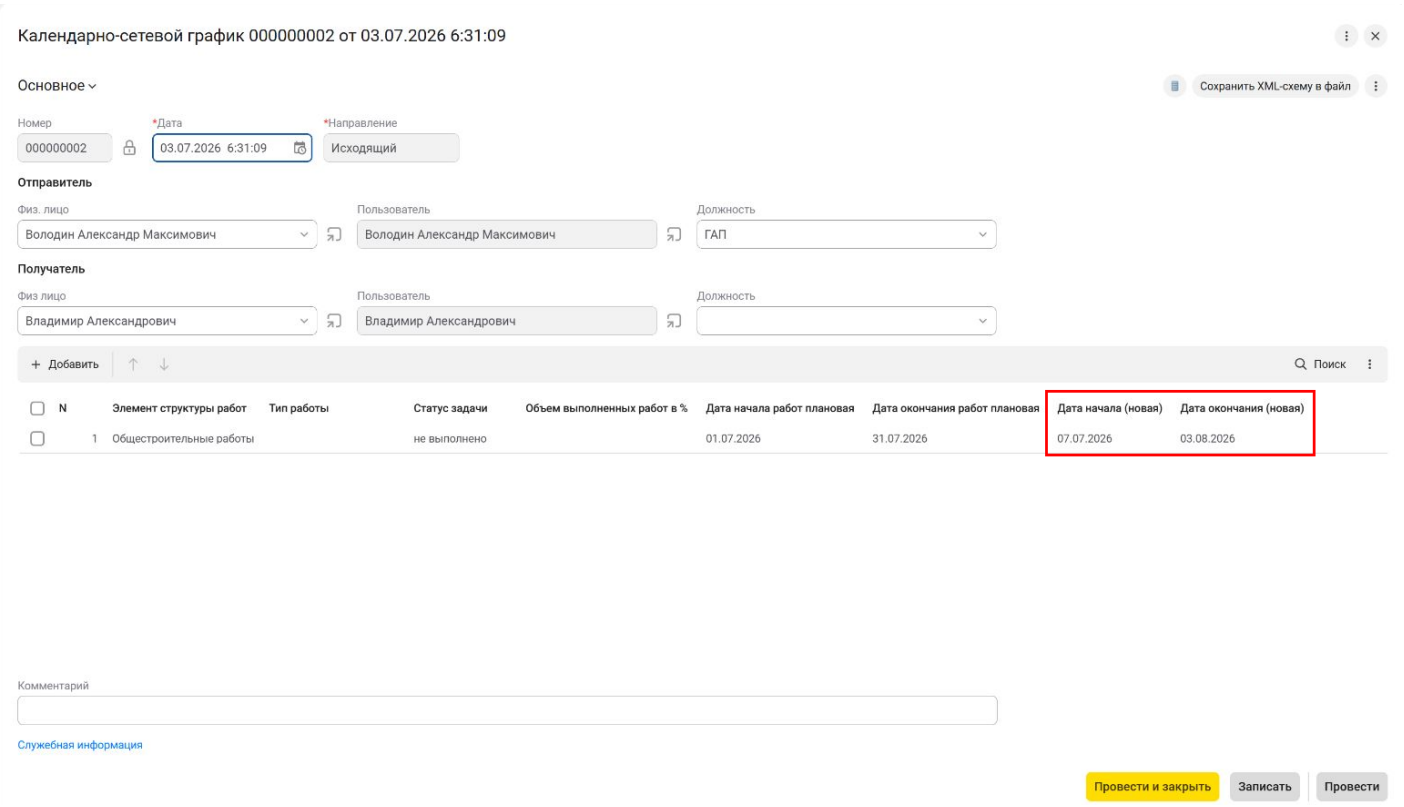

Рисунок 87 – Добавление структуры работ в документ КСГ

После заполнения данных необходимо нажать «Записать», затем «Провести» и отправить документ на согласование (Рисунок 88). Задача на согласование будет направлена пользователю, указанному в получателях документа.

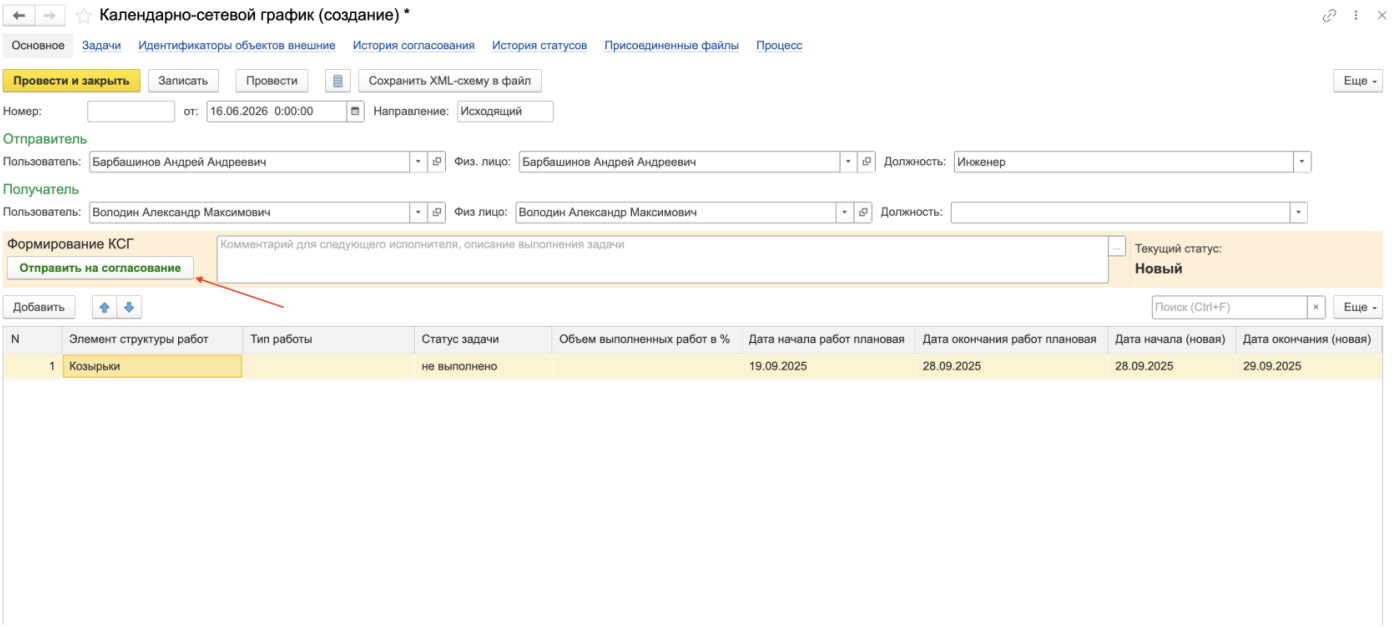

Рисунок 88 – Отправка документа КСГ на согласование

Пользователь, указанный в получателях, должен открыть полученную задачу и выполнить согласование документа. Пересчет дат структуры работ выполняется после того, как документ КСГ примет финальный статус. (Рисунок 89).

> *Статус документа считается финальным, если в карточке статуса документа установлен флажок «Финальный».*

Такси

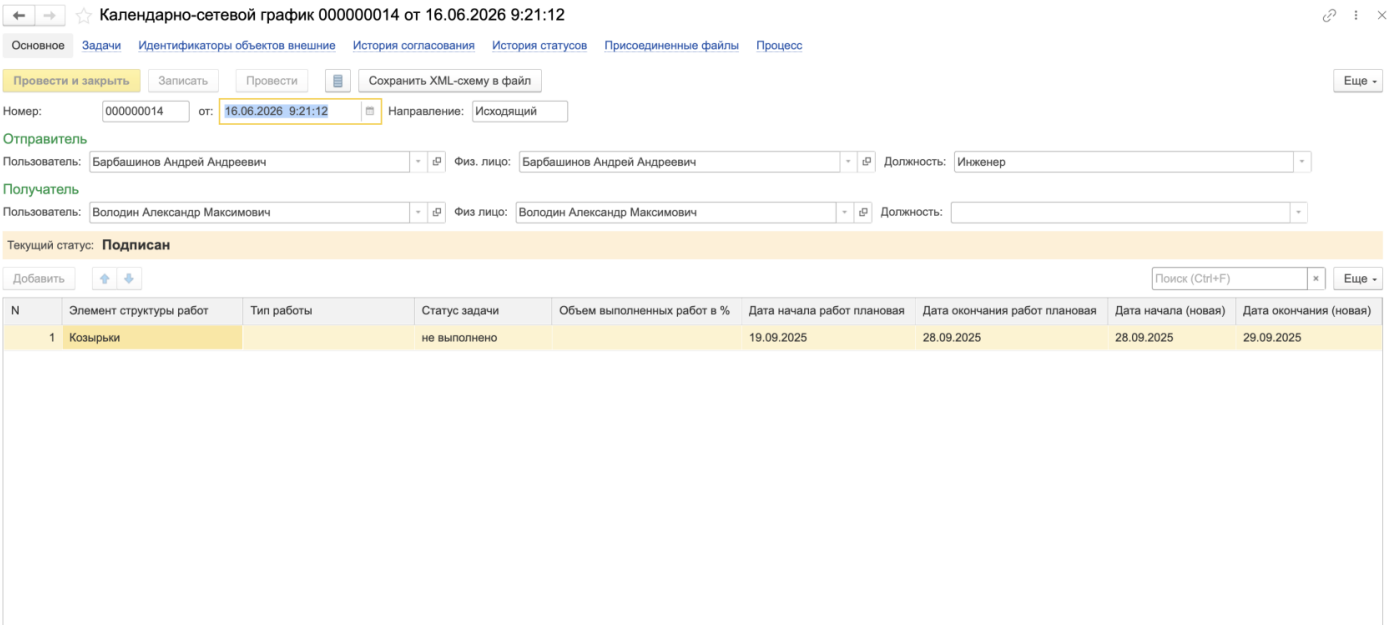

Рисунок 89 – Подписание документа КСГ

Результат изменения дат можно проверить в самой структуре работ. Для этого необходимо открыть элемент структуры работ, который был указан в документе КСГ, и проверить обновленные даты выполнения. Запись о выполненном изменении также отображается в табличной части «История изменений» (Рисунок 90).

Такси

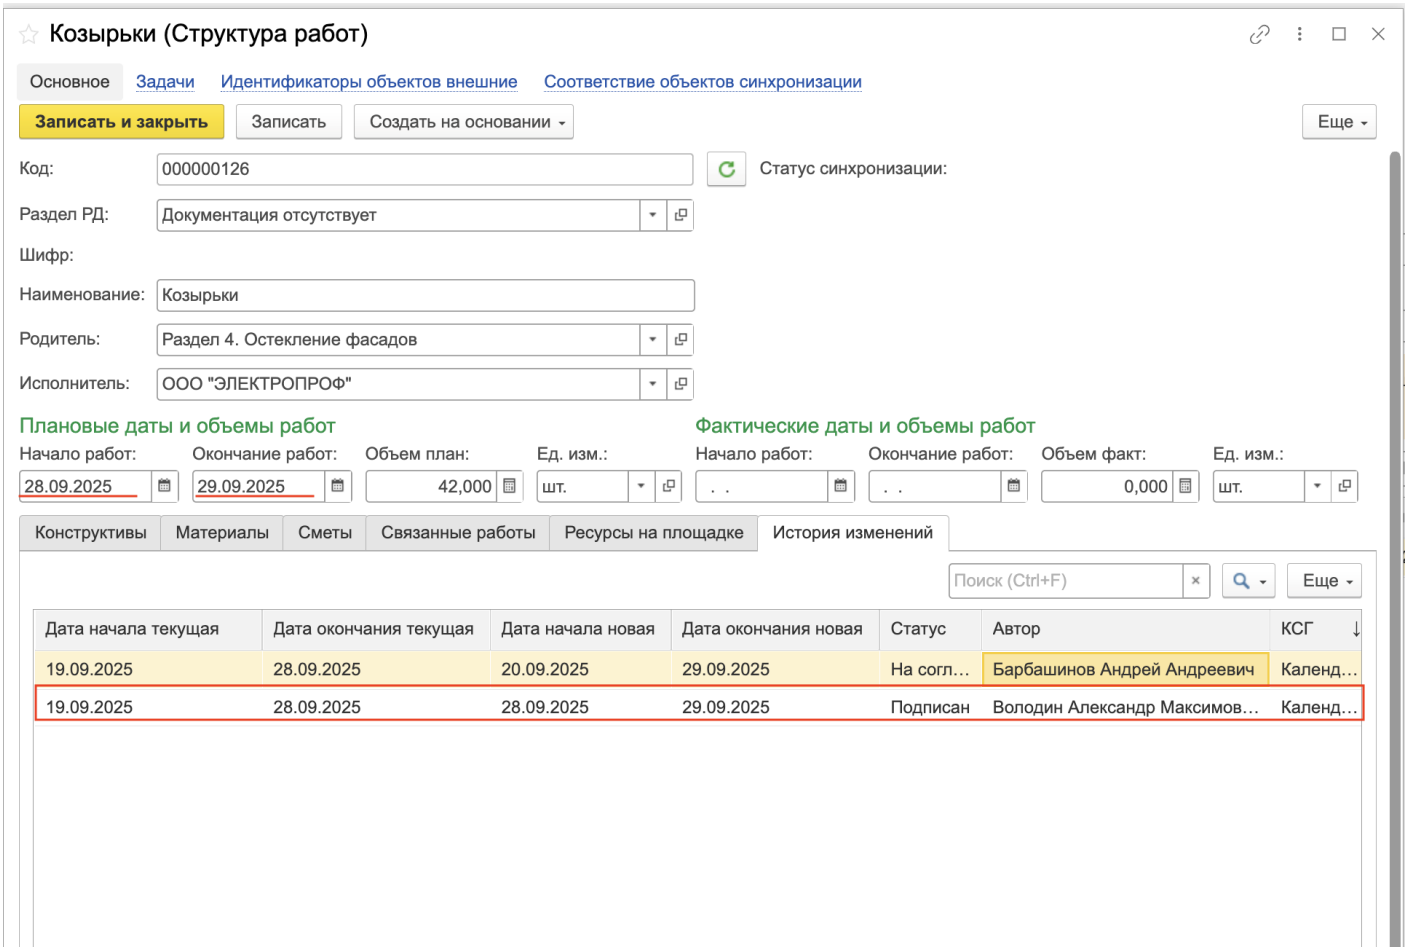

Рисунок 90 – История изменений структуры работ

Revision #1
Created 2026-10-15 08:50:50 UTC by Александр
Updated 2026-10-15 08:50:50 UTC by Александр
